

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 08/06/2026
Nº do Empenho: 135 Data do empenho....: 11/02/2026

Contrato: 19/2026
Licitação: 6/2025 Processo.
Modalidade: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia
Obra: 1/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3427 - E X L ENGENHARIA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 33.188.055/0001-26
Endereço: Rua Luís Ceciliano Vilares, Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.081.654,39
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	127.976,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	154.560,80
Saldo a pagar do Empenho	1.927.093,59
Líquido a Pagar	127.976,36

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Figueirão/MS, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 842	
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 15	Urbanismo
Sub-Função.....: 451	Infra-Estrutura Urbana
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
El. Despesa.....: 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

2500.7000 Sem Código de Acompanhamento	127.976,36
--	------------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26!	DEBITO EM CONTA 0	127.976,36
--	-------------------	------------

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10265-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 6381 PLAT. EMPR. CIDADE MORENA, MS
Conta corrente (com DV) 5698176465
CNPJ 33.188.055/0001-26
Nome favorecido E X L ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.816
Valor 127.976,36
Destinação 0
Data transferência 08/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1ADF41554888F9A5

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO


08/06/2026 14:01:37

08/06/2026 15:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 17/07/2026
Conta Extra-Orçamentária: 1 - INSS	
CREDOR	
3427 - E X L ENGENHARIA LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	17.001,68
Líquido a Pagar	17.001,68
Dezessete Mil, e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTC DEBITO EM CONTA 0	17.001,68
ASSINATURAS	
 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 430	Data...: 01/06/2026
Ref OP nº 1926 – Emp. nº 135 – E X L ENGENHARIA LTDA – 33188055000126	
Numero da Nota Fiscal : 79	
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
1	21881010200 INSS
VALOR	
17.001,68 Dezesete Mil, e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos.	
HISTÓRICO	
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Figueirão/MS, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295 C/C: 10.265-2 VALOR: 17.001,68
FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.	
Emitido por: ALTAMIRO	
Recebido em: ____ / ____ / ____ .	
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL	

CNPJ
07.158.578/0001-10

Razão Social
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26187.3886346-9

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Valor Total do Documento

17.001,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	17.001,68			17.001,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:33.188.055/0001-26				
	Totais	17.001,68			17.001,68

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/07/2026 16:44:30

85860000170 1 01680385262 9 01071626187 9 38863469620 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000170 1 01680385262 9 01071626187 9 38863469620 6

CNPJ: 07.158.578/0001-10
Número: 07.16.26187.3886346-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 17.001,68





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.36
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000170-1 01680385262-9
01071626187-9 38863469620-6

Data do pagamento 17/07/2026
Numero do Documento 07.16.26187.3886346-9
Valor Total 17.001,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	17/07/2026 11:07:11
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	17/07/2026 11:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 01/06/2026
Nº do Empenho: 135 Data do empenho....: 11/2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3427 - E X L ENGENHARIA LTDA C.N.P.J/C.P.F.:33.188.055/0001-26
Endereço: Rua Luís Ceciliano Vilarés, Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone...: FAX....:
Banco..... Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.081.654,39
Valor da Nota de Liquidação: 154.560,80
Valor a Liquidar.....: 1.927.093,59

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	1.854,72
684	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	10.265-2	7.728,04
1	INSS	11	10.265-2	17.001,68

Total das Retenções: 26.584,44

Valor Líquido Liquidado: 127.976,36

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Figueirão/MS, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 842
Órg. Unid.....: 07.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 15 Urbanismo
Sub-Função...: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa.....: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 1080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
El. Despesa...: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
F. de Recursos.: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

2500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 154.560,80


Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
79/0	01/06/2026		154.560,80	0,00	154.560,80

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 1.854,72 (Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Figueirão/MS, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 1926 - Emp. nº 135 - E X L ENGENHARIA LTDA - 33188055000126
Lançamento Nº:	1642	Numero da Nota Fiscal : 79
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	Assinatura  THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Dedução	NÃO	
Vencimento	01/06/2026	
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2	
Autenticação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 7.728,04 (Sete Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Figueirão/MS, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 1926 - Emp. nº 135 - E X L ENGENHARIA LTDA - 33188055000126
Lançamento Nº:	1643	Numero da Nota Fiscal : 79
Cod. Receita	684 / 1.1.1.4.51.1.1	Assinatura  THIAGO INACIO D. PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Dedução	NÃO	
Vencimento	01/06/2026	
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2	
Autenticação		



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/05/2026 16:59:14
Competência 05/2026
Número / Série 79 / U
Código de Verificação nd8c3rffv

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.188.055/0001-26
Nome / Nome Empresarial E X L ENGENHARIA LTDA
Endereço RUA LUIS CECILIANO VILARES 220 SALA 06 GLORIA

Inscrição Municipal 00262505006
Telefone (67) 3325-0526
E-mail tiagobacha@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79004-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 07.158.578/0001-10
Nome / Nome Empresarial MUNICÍPIO FIGUEIRÃO
Endereço AVENIDA MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO 591 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 3274-1261
E-mail licitacao@figueirao.ms.gov.br
Município FIGUEIRAO / MS BRASIL
CEP 79428-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço FIGUEIRAO / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Nº EMPENHO:135 - ORDEM DE SERVIÇO Nº1089/2026 - CÓDIGO 27117.
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO - Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços. No Município de Figueirão/MS.
Dotação: 07.001-15.451.0004.1080-4.4.90.51.00.2500.0007000 - Fonte de Recursos: 500 - Sub Elemento: 0 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
PERÍODO DO BOLETIM: 09/03/2026 A 07/05/2026.
Concorrência Eletrônica: 6/2025
Processo Administrativo: 17707/2025
Contrato: 19/2026
CNO OBRA 90.028.70767/73
VALOR BASE DE CALCULO DO INSS: R\$ 154.560,80
VALOR DE A SER RETIDO INSS R\$ 17.001,68
VALOR DE A SER RETIDO DE IR R\$ 1.854,72
BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 6381, C/C 569817646-5.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN FIGUEIRAO - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
154.560,80	0,00	0,00	154.560,80	5,000000	7.728,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
7.728,04	1.854,72	0,00	0,00	17.001,68	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
154.560,80	26.584,44	0,00	0,00	127.976,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não gera boleto

Código Obra: 10235, Endereço da obra: AVENIDA MOISÉS ARAUJO GALVÃO, 592, FIGUEIRÃO VELHO, FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL, 79428000

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS**

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
os serviços constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 25 de 05 de 26

Marcos P. Barbosa
ASSINATURA POR EXTENSO

074.360.044-04
RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirão/MS

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE SERVIÇO Nº 1089/2026 - CÓDIGO 27117**SOLICITANTE****Orgão:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**Unidade:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**Setor:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**CNPJ:** . . / -**Solicitante..:** RONIS DA SILVA MOREIRA**Responsável:** RONIS DA SILVA MOREIRA**Destino:** GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS**Veículo:****Placa:****Motorista:****FORNECEDOR****CNPJ:** 33188055000126**Razão Social:** 3473 - EXL Engenharia Ltda**Nome Fantasia:** EXL Engenharia Ltda**Insc.Est.:** 284866725**Cidade:** Campo Grande / MS**Tel. Fixo:** (67) 99800-1720**LICITAÇÃO****Modalidade:** Conc. Eletrônica**Tipo:** Normal**Código da Licitação:** 2180**Data Homologação:** 09/02/2026**Nr. Licitação:** 06/2025**Nr. Contrato:** 19/2026 - Dt. Venc: 08/02/2027**Nr. Processo da Licitação:** 17707/2025**Utilização:** Contratação de empresa especializada para à execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços.**Observações:****DOTAÇÃO****Código Reduzido:** 842 - **Dotação:** 07.001-15.451.0004.1080-4.4.90.51.00.2500.0007000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub****Elemento:** 0 - OBRAS E INSTALAÇÕES - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento**ITENS**

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
19901	1	Execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, localizado nas coordenadas geográficas 18°40'53.9"S / 53°37'48.2"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SV	154560,8	0,00	154.560,80

Valor Total: 154.560,80**Desconto direto na Requisição:** 0,00**Valor Desconto:** 0,00**Valor Tarifas:** 0,00**Valor Liquido:** 154.560,80**sexta-feira, 22 de maio de 2026**

Declaro que os valores constantes na Ordem de Serviço, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO



EXL Engenharia LTDA.
CNPJ: 33.188.055/0001-24
Cel: +55 47 99800-1720
Email: tiagobacha@gmail.com

Rua: Luís Ceciliano Vilarés, nº 220
Vila: Glória - Campo Grande/MS
CEP: 79.004-280

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra:	R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato:	Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha		Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009		Valor da Med.: R\$ 154.560,80

RESUMO DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Valor Mês 01 (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.016,70
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 90.028,52
3	ALVENARIA PAINÉIS DIVISÓRIAS	R\$ 0,00
4	PISOS E REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 0,00
5	PINTURA	R\$ 0,00
6	COBERTURA	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS AGUA FRIA	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÃO REDE PPR - REDE DE GÁS	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 0,00
13	MURO DE FECHAMENTO	R\$ 0,00
14	PSCIP	R\$ 0,00
15	FACHADA EM ACM, COBERTURA E PELE EM VIDRO LAMINADO E BRISSE METÁLICO	R\$ 0,00
16	CASA DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 0,00
17	LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)	R\$ 0,00
18	PROJETO DE LICENÇA AMBIENTAL	R\$ 0,00
19	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 6.515,58
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$):		R\$ 2.081.654,39
VALOR DO PERÍODO (R\$):		R\$ 154.560,80
PERCENTUAL TOTAL DO CONTRATO (%):		100,00%
PERCENTUAL PERÍODO (%):		7,42%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS:		R\$ 154.560,80
VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:		R\$ 0,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		R\$ 154.560,80
PERCENTUAL EXECUTADO:		7,42%
SALDO DA OBRA:		1.927.093,59
VALOR DO ORÇAMENTO ATUALIZADO:		2.081.654,39



Documento assinado digitalmente
TIAGO CORTEZ BACHA
Data: 22/05/2026 15:36:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Responsável Técnico / Eng. Civil Tiago Cortez Bacha
CREA Nº: 5069708728 SP - MS VISTO 32009

Fiscal do Contrato / Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa
CREA/CAU Nº: SP 5069708256 Visto 30683



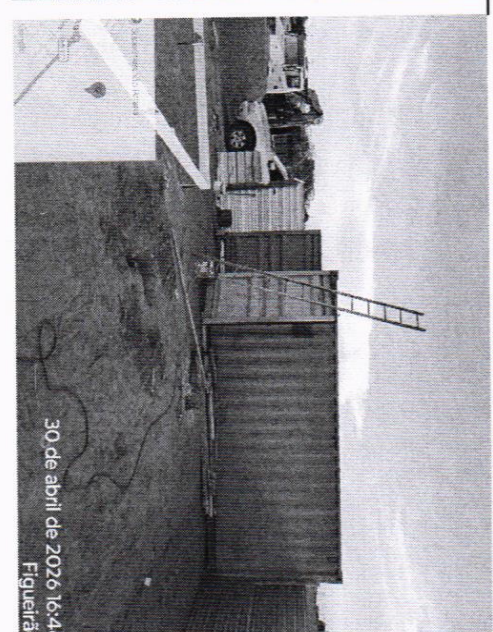
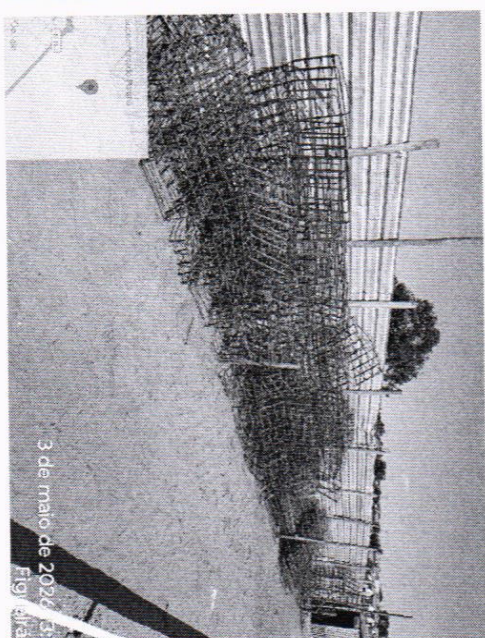
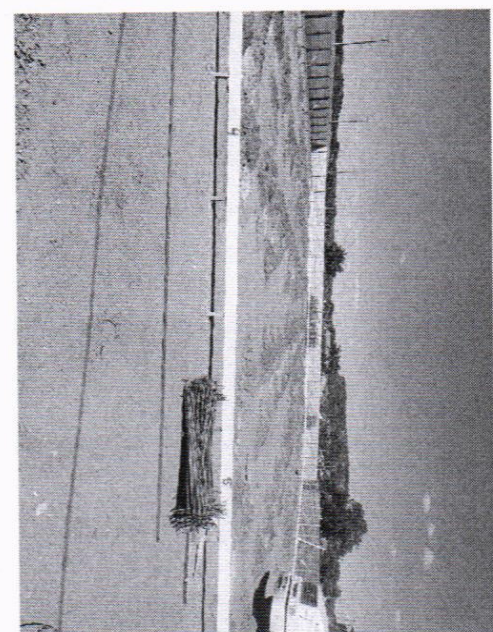
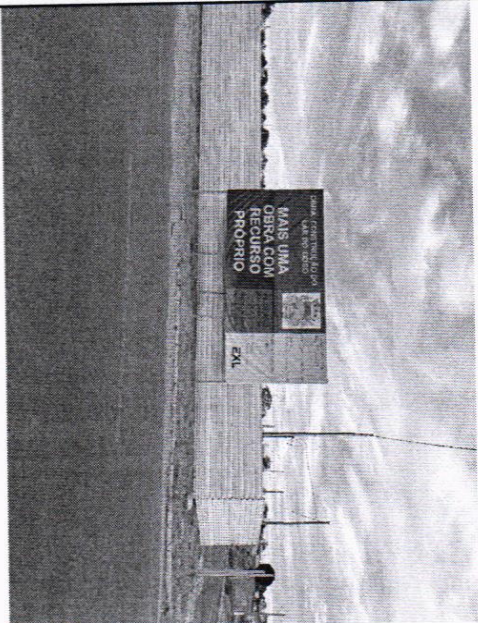
Documento assinado digitalmente
LUCAS PARREIRA BARBOSA
Data: 22/05/2026 15:47:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EXL
ENGENHARIA

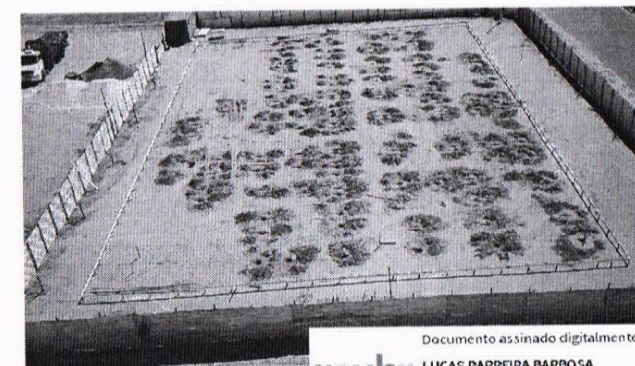
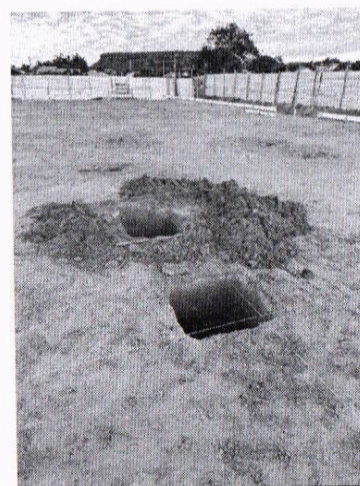
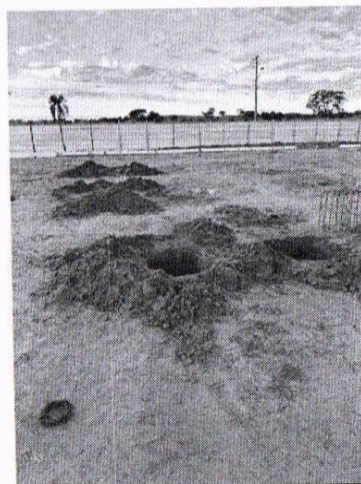
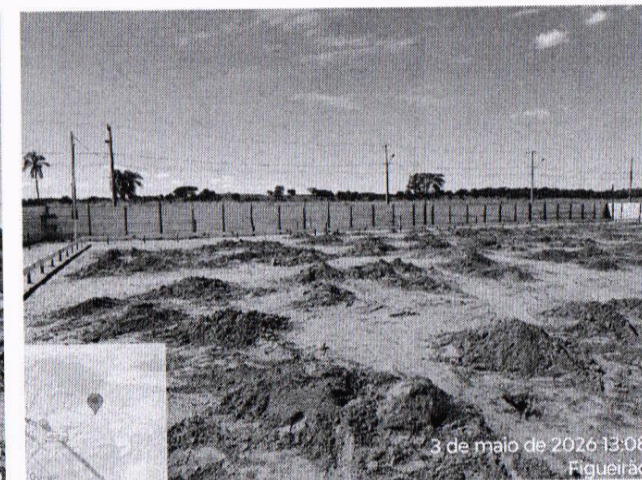
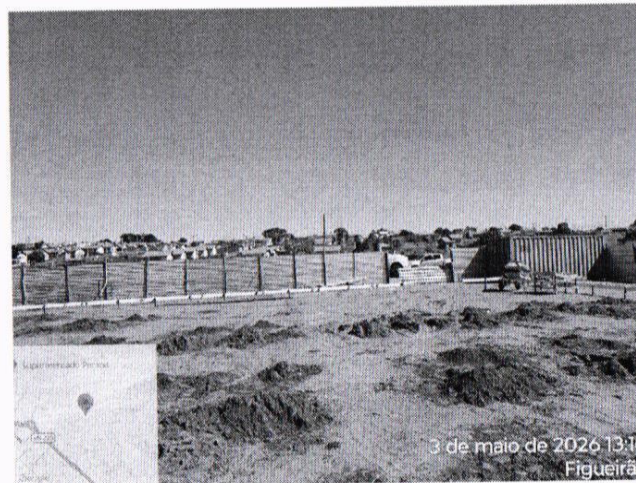
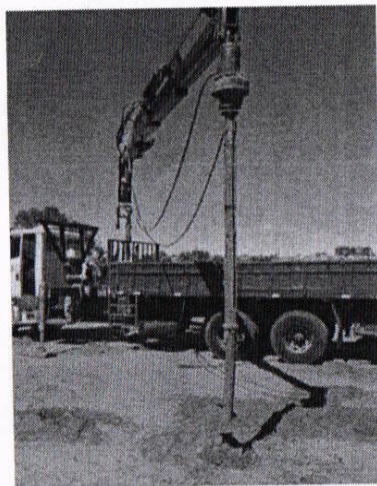
EXL Engenharia LTDA.
CNPJ: 33.188.055/0001-24
Cel: +55 67 97800-1720
Email: tiagobachia@gmail.com
Rua: Luís Ceciliano Vilarés, nº 220
Vila: Glória - Campo Grande/MS
CEP: 79.004-280

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: 2.081.654,39	Relatório Fotográfico Referência a Medição Nº : 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: 2.081.654,39	Relatório Fotográfico Referencia a Medição Nº : 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICOResponsável Técnico / Eng. Civil Tiago Cortez Bacha
CREA Nº: 5069708728 SP - MS VISTO 32009Documento assinado digitalmente
TIAGO CORTEZ BACHA
Data: 22/05/2026 15:36:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Fiscal do Contrato / Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa
CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683Documento assinado digitalmente
LUCAS PARREIRA BARBOSA
Data: 22/05/2026 15:46:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				58.016,70				58.016,70	58.016,70	0,00	100,00%
1.1	SERVIÇOS DIVERSOS				58.016,70				58.016,70	58.016,70	0,00	100,00%
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	142,00	64,54	9.164,68	-	142,00	142,00	9.164,68	9.164,68	0,00	100,00%
1.1.2	EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	m²	18,00	615,68	11.082,24	-	18,00	18,00	11.082,24	11.082,24	0,00	100,00%
1.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	18,00	444,83	8.006,94	-	18,00	18,00	8.006,94	8.006,94	0,00	100,00%
1.1.4	ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSÃO, COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- BIFASICO 0 A 10,1 KW	UN	1,00	4.745,53	4.745,53	-	1,00	1,00	4.745,53	4.745,53	0,00	100,00%
1.1.5	SINAPI - 95635 - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1,00	193,87	193,87	-	1,00	1,00	193,87	193,87	0,00	100,00%
1.1.6	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF 03/2024	m²	276,00	89,94	24.823,44	-	276,00	276,00	24.823,44	24.823,44	0,00	100,00%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO				276.846,62				90.028,52	90.028,52	186.818,10	32,51%
2.1.1	ESCAVAÇÃO BALDRAMES E BLOCO				6.650,87				-	0,00	6.650,87	0,00%
2.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	20,73	221,23	4.586,09	-	-	-	-	0,00	4.586,09	0,00%
2.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	20,16	102,42	2.064,78	-	-	-	-	0,00	2.064,78	0,00%
2.1.2	CONCRETO E FORMA				188.137,50				39.811,20	39.811,20	148.326,30	21,16%
2.1.2.1	FORMA CONSTRUÇÃO				77.087,84				-	0,00	77.087,84	0,00%
2.1.2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	327,00	161,41	52.781,07	-	-	-	-	0,00	52.781,07	0,00%
2.1.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	239,83	101,35	24.306,77	-	-	-	-	0,00	24.306,77	0,00%
2.1.2.2	CONCRETO CONSTRUÇÃO				111.049,66				39.811,20	39.811,20	71.238,46	35,84%
2.1.2.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	330,00	120,64	39.811,20	-	330,00	330,00	39.811,20	39.811,20	0,00	100,00%
2.1.2.2.2	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	37,17	742,40	27.595,00	-	-	-	-	0,00	27.595,00	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
2.1.2.2.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	24,93	1.017,55	25.367,52	-	-	-	-	0,00	25.367,52	0,00%
2.1.2.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	18,31	998,14	18.275,94	-	-	-	-	0,00	18.275,94	0,00%
2.1.3	ARMADURA CONSTRUÇÃO				82.058,25				50.217,32	50.217,32	31.840,93	61,19%
2.1.3.2	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	400,00	10,32	4.128,00	-	400,00	400,00	4.128,00	4.128,00	0,00	100,00%
2.1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	895,00	15,92	14.248,40	-	895,00	895,00	14.248,40	14.248,40	0,00	100,00%
2.1.3.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	325,00	16,76	5.447,00	-	162,50	162,50	2.723,50	2.723,50	2.723,50	50,00%
2.1.3.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	216,00	14,04	3.032,64	-	108,00	108,00	1.516,32	1.516,32	1.516,32	50,00%
2.1.3.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	780,00	12,46	9.718,80	-	390,00	390,00	4.859,40	4.859,40	4.859,40	50,00%
2.1.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	162,00	10,53	1.705,86	-	81,00	81,00	852,93	852,93	852,93	50,00%
2.1.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	746,00	13,99	10.436,54	-	373,00	373,00	5.218,27	5.218,27	5.218,27	50,00%
2.1.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	534,00	12,01	6.413,34	-	267,00	267,00	3.206,67	3.206,67	3.206,67	50,00%
2.1.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.355,00	10,67	25.127,85	-	1.177,50	1.177,50	12.563,92	12.563,92	12.563,93	49,99%
2.1.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	202,00	8,91	1.799,82	-	101,00	101,00	899,91	899,91	899,91	50,00%
3	ALVENARIA PAINÉIS DIVISÓRIAS				81.044,04				-	0,00	81.044,04	0,00%
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				81.044,04				-	0,00	81.044,04	0,00%
3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1.372,00	59,07	81.044,04	-	-	-	-	0,00	81.044,04	0,00%
4	PISOS E REVESTIMENTO DE PAREDES				376.144,05				-	0,00	376.144,05	0,00%
4.1	REVESTIMENTO DE PAREDES				183.699,26				-	0,00	183.699,26	0,00%
4.1.1	CHAPISCO				23.324,00				-	0,00	23.324,00	0,00%
4.1.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	2.744,00	8,50	23.324,00	-	-	-	-	0,00	23.324,00	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueira	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
4.1.2	REBOCO				108.541,16				-	0,00	108.541,16	0,00%
4.1.2.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1.097,46	60,97	66.912,13	-	-	-	-	0,00	66.912,13	0,00%
4.1.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.110,70	37,48	41.629,03	-	-	-	-	0,00	41.629,03	0,00%
4.1.3	REVESTIMENTOS CERÂMICO				51.834,10				-	0,00	51.834,10	0,00%
4.1.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	655,63	79,06	51.834,10	-	-	-	-	0,00	51.834,10	0,00%
4.2	PISOS				192.444,79				-	0,00	192.444,79	0,00%
4.2.1	GRANILITE				120.056,95				-	0,00	120.056,95	0,00%
4.2.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	746,52	40,49	30.226,59	-	-	-	-	0,00	30.226,59	0,00%
4.2.1.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	746,52	99,13	74.002,52	-	-	-	-	0,00	74.002,52	0,00%
4.2.1.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	617,07	25,65	15.827,84	-	-	-	-	0,00	15.827,84	0,00%
4.2.2	CALÇAMENTO				55.599,43				-	0,00	55.599,43	0,00%
4.2.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	36,59	774,15	28.326,14	-	-	-	-	0,00	28.326,14	0,00%
4.2.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	296,32	92,04	27.273,29	-	-	-	-	0,00	27.273,29	0,00%
4.2.3	GRAMA				16.788,41				-	0,00	16.788,41	0,00%
4.2.3.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.188,14	14,13	16.788,41	-	-	-	-	0,00	16.788,41	0,00%
5	PINTURA				153.796,83				-	0,00	153.796,83	0,00%
5.1	PINTURA PAREDE				150.093,37				-	0,00	150.093,37	0,00%
5.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	906,20	20,53	18.604,28	-	-	-	-	0,00	18.604,28	0,00%
5.1.2	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5.488,00	3,99	21.897,12	-	-	-	-	0,00	21.897,12	0,00%
5.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	723,68	29,70	21.493,29	-	-	-	-	0,00	21.493,29	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
5.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	540,70	12,51	6.764,15	-	-	-	-	0,00	6.764,15	0,00%
5.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	182,98	17,69	3.236,91	-	-	-	-	0,00	3.236,91	0,00%
5.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	977,66	29,70	29.036,50	-	-	-	-	0,00	29.036,50	0,00%
5.1.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	681,30	12,51	8.523,06	-	-	-	-	0,00	8.523,06	0,00%
5.1.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,36	17,69	5.242,60	-	-	-	-	0,00	5.242,60	0,00%
5.1.9	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	746,52	34,24	25.560,84	-	-	-	-	0,00	25.560,84	0,00%
5.1.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	746,52	13,04	9.734,62	-	-	-	-	0,00	9.734,62	0,00%
5.2	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA				3.703,46				-	0,00	3.703,46	0,00%
5.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	81,00	10,32	835,92	-	-	-	-	0,00	835,92	0,00%
5.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	273,36	10,49	2.867,54	-	-	-	-	0,00	2.867,54	0,00%
6	COBERTURA				266.731,01				-	0,00	266.731,01	0,00%
6.1	FORRO				25.319,41				-	0,00	25.319,41	0,00%
6.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	504,17	50,22	25.319,41	-	-	-	-	0,00	25.319,41	0,00%
6.2	ESTRUTURA METÁLICA				108.883,02				-	0,00	108.883,02	0,00%
6.2.1	TESOURAS METÁLICAS				108.883,02				-	0,00	108.883,02	0,00%
6.2.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	747,44	47,12	35.219,37	-	-	-	-	0,00	35.219,37	0,00%
6.2.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	705,84	4.235,04	-	-	-	-	0,00	4.235,04	0,00%
6.2.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	30,00	901,00	27.030,00	-	-	-	-	0,00	27.030,00	0,00%
6.2.1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	17,00	1.126,65	19.153,05	-	-	-	-	0,00	19.153,05	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
6.2.1.5	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	785,93	18,55	14.579,00	-	-	-	-	0,00	14.579,00	0,00%
6.2.1.6	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	848,00	10,22	8.666,56	-	-	-	-	0,00	8.666,56	0,00%
6.3	TELHAMENTO				132.528,58				-	0,00	132.528,58	0,00%
6.3.1	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	747,44	177,31	132.528,58	-	-	-	-	0,00	132.528,58	0,00%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS				203.350,87				-	0,00	203.350,87	0,00%
7.1	PORTAS				79.286,28				-	0,00	79.286,28	0,00%
7.1.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	52,92	895,01	47.363,92	-	-	-	-	0,00	47.363,92	0,00%
7.1.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	20,79	487,30	10.130,96	-	-	-	-	0,00	10.130,96	0,00%
7.1.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 02/04 FOLHAS COM FECHADURA BATE E FECHA 10MM INCOLOR COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR E ACABAMENTO	M²	27,30	798,22	21.791,40	-	-	-	-	0,00	21.791,40	0,00%
7.2	JANELAS				24.603,43				-	0,00	24.603,43	0,00%
7.2.1	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS/2FOLHAS COM FECHADURA BATE E FECHA, 8 MM INCOLOR, COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR E ACABAMENTOS, JANELAS E VIDRO FIXO	M²	40,72	604,21	24.603,43	-	-	-	-	0,00	24.603,43	0,00%
7.3	VERGA E CONTRA VERGA				18.312,46				-	0,00	18.312,46	0,00%
7.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	176,30	75,97	13.393,51	-	-	-	-	0,00	13.393,51	0,00%
7.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	86,80	56,67	4.918,95	-	-	-	-	0,00	4.918,95	0,00%
7.4	SOLEIRAS E PINGADEIRAS				7.847,16				-	0,00	7.847,16	0,00%
7.4.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	44,80	175,16	7.847,16	-	-	-	-	0,00	7.847,16	0,00%
7.5	GRADIL E FECHAMENTO				73.301,54				-	0,00	73.301,54	0,00%
7.5.1	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	23,44	501,63	11.758,20	-	-	-	-	0,00	11.758,20	0,00%
7.5.2	GRADIL METALICO COM PERFIL EM METALON COM REQUADRO E MONTANTES VERTICAIS 50 X 50 E MONTANTES HORIZONTAIS 30 X 50, FIXADOS EM PILARES E ALVENARIAS, INCLUSO 02 DEMÃO DE ZARÇÃO E 02 DEMÃO DE PINTURA ALIQUIDICA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	107,52	415,37	44.660,58	-	-	-	-	0,00	44.660,58	0,00%
7.5.3	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	106,88	157,96	16.882,76	-	-	-	-	0,00	16.882,76	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				100.582,38				-	0,00	100.582,38	0,00%
8.1	ELETRODUTOS				24.131,41				-	0,00	24.131,41	0,00%
8.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	19,19	287,85	-	-	-	-	0,00	287,85	0,00%
8.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	20,05	501,25	-	-	-	-	0,00	501,25	0,00%
8.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,00	16,05	176,55	-	-	-	-	0,00	176,55	0,00%
8.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,00	11,97	1.460,34	-	-	-	-	0,00	1.460,34	0,00%
8.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	19,00	9,70	184,30	-	-	-	-	0,00	184,30	0,00%
8.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	14,21	923,65	-	-	-	-	0,00	923,65	0,00%
8.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	612,00	21,79	13.335,48	-	-	-	-	0,00	13.335,48	0,00%
8.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	262,00	11,82	3.096,84	-	-	-	-	0,00	3.096,84	0,00%
8.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,00	26,72	587,84	-	-	-	-	0,00	587,84	0,00%
8.1.10	ELETROCALHA PERFURADA, 200 X 100 (CHAPA Nº 18) COM SUPORTE EM PERFILADO FIXADOS A CADA 1,50 METROS INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	68,81	2.408,35	-	-	-	-	0,00	2.408,35	0,00%
8.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	18,86	414,92	-	-	-	-	0,00	414,92	0,00%
8.1.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,26	48,52	-	-	-	-	0,00	48,52	0,00%
8.1.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	23,32	46,64	-	-	-	-	0,00	46,64	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
8.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	44,00	12,14	534,16	-	-	-	-	0,00	534,16	0,00%
8.1.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	15,82	63,28	-	-	-	-	0,00	63,28	0,00%
8.1.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	4,00	15,36	61,44	-	-	-	-	0,00	61,44	0,00%
8.2	CABOS DE COBRE				26.140,54				-	0,00	26.140,54	0,00%
8.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	435,00	3,70	1.609,50	-	-	-	-	0,00	1.609,50	0,00%
8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3.054,00	4,46	13.620,84	-	-	-	-	0,00	13.620,84	0,00%
8.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	795,00	6,88	5.469,60	-	-	-	-	0,00	5.469,60	0,00%
8.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50,00	38,53	1.926,50	-	-	-	-	0,00	1.926,50	0,00%
8.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	70,00	10,33	723,10	-	-	-	-	0,00	723,10	0,00%
8.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50,00	55,82	2.791,00	-	-	-	-	0,00	2.791,00	0,00%
8.3	CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				20.254,83				-	0,00	20.254,83	0,00%
8.3.1	CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES				14.915,35				-	0,00	14.915,35	0,00%
8.3.1.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	65,00	15,43	1.002,95	-	-	-	-	0,00	1.002,95	0,00%
8.3.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	67,00	11,67	781,89	-	-	-	-	0,00	781,89	0,00%
8.3.1.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	59,00	18,96	1.118,64	-	-	-	-	0,00	1.118,64	0,00%
8.3.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	78,00	33,83	2.638,74	-	-	-	-	0,00	2.638,74	0,00%
8.3.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30,00	48,60	1.458,00	-	-	-	-	0,00	1.458,00	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
8.3.1.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	44,00	48,13	2.117,72	-	-	-	-	0,00	2.117,72	0,00%
8.3.1.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	48,00	46,79	2.245,92	-	-	-	-	0,00	2.245,92	0,00%
8.3.1.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	23,00	33,18	763,14	-	-	-	-	0,00	763,14	0,00%
8.3.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	45,00	29,99	1.349,55	-	-	-	-	0,00	1.349,55	0,00%
8.3.1.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	37,48	299,84	-	-	-	-	0,00	299,84	0,00%
8.3.1.11	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	58,67	352,02	-	-	-	-	0,00	352,02	0,00%
8.3.1.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	2,00	393,47	786,94	-	-	-	-	0,00	786,94	0,00%
8.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				5.339,48				-	0,00	5.339,48	0,00%
8.3.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	851,45	1.702,90	-	-	-	-	0,00	1.702,90	0,00%
8.3.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	16,00	11,84	189,44	-	-	-	-	0,00	189,44	0,00%
8.3.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	9,00	11,84	106,56	-	-	-	-	0,00	106,56	0,00%
8.3.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	12,83	12,83	-	-	-	-	0,00	12,83	0,00%
8.3.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	15,44	15,44	-	-	-	-	0,00	15,44	0,00%
8.3.2.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	10,00	56,29	562,90	-	-	-	-	0,00	562,90	0,00%
8.3.2.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	58,27	116,54	-	-	-	-	0,00	116,54	0,00%
8.3.2.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	60,23	60,23	-	-	-	-	0,00	60,23	0,00%
8.3.2.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	11,00	63,38	697,18	-	-	-	-	0,00	697,18	0,00%
8.3.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	157,66	315,32	-	-	-	-	0,00	315,32	0,00%
8.3.2.11	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	8,00	94,01	752,08	-	-	-	-	0,00	752,08	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
8.3.2.12	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	4,00	77,27	309,08	-	-	-	-	0,00	309,08	0,00%
8.3.2.13	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	2,00	249,49	498,98	-	-	-	-	0,00	498,98	0,00%
8.4	LUMINÁRIAS				21.014,98				-	0,00	21.014,98	0,00%
8.4.1	LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE SOBREPOR 2X 18 W ALTO BRILHO ALUMINIUM COM DUAS LAMPADAS LED	UD	65,00	231,41	15.041,65	-	-	-	-	0,00	15.041,65	0,00%
8.4.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	4,00	32,14	128,56	-	-	-	-	0,00	128,56	0,00%
8.4.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	343,81	5.844,77	-	-	-	-	0,00	5.844,77	0,00%
8.5	ENTRADA DE ENERGIA				9.040,62				-	0,00	9.040,62	0,00%
8.5.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	2,00	2.392,05	4.784,10	-	-	-	-	0,00	4.784,10	0,00%
8.5.2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	2,00	580,04	1.160,08	-	-	-	-	0,00	1.160,08	0,00%
8.5.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	2,00	1.548,22	3.096,44	-	-	-	-	0,00	3.096,44	0,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS AGUA FRIA				56.221,78				-	0,00	56.221,78	0,00%
9.1	TUBOS E CONEXÕES				31.358,09				-	0,00	31.358,09	0,00%
9.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	356,00	24,90	8.864,40	-	-	-	-	0,00	8.864,40	0,00%
9.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	3,00	34,21	102,63	-	-	-	-	0,00	102,63	0,00%
9.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	177,00	31,52	5.579,04	-	-	-	-	0,00	5.579,04	0,00%
9.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	4,00	27,89	111,56	-	-	-	-	0,00	111,56	0,00%
9.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	45,00	37,36	1.681,20	-	-	-	-	0,00	1.681,20	0,00%
9.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	51,00	6,47	329,97	-	-	-	-	0,00	329,97	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
9.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	6,47	25,88	-	-	-	-	0,00	25,88	0,00%
9.1.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	37,36	74,72	-	-	-	-	0,00	74,72	0,00%
9.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,00	31,61	600,59	-	-	-	-	0,00	600,59	0,00%
9.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	26,53	344,89	-	-	-	-	0,00	344,89	0,00%
9.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	83,78	1.256,70	-	-	-	-	0,00	1.256,70	0,00%
9.1.12	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	13,16	105,28	-	-	-	-	0,00	105,28	0,00%
9.1.13	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2.044,63	4.089,26	-	-	-	-	0,00	4.089,26	0,00%
9.1.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	11,61	116,10	-	-	-	-	0,00	116,10	0,00%
9.1.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	29,23	321,53	-	-	-	-	0,00	321,53	0,00%
9.1.16	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	13,18	171,34	-	-	-	-	0,00	171,34	0,00%
9.1.17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	13,73	713,96	-	-	-	-	0,00	713,96	0,00%
9.1.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	6,31	18,93	-	-	-	-	0,00	18,93	0,00%
9.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	65,00	10,04	652,60	-	-	-	-	0,00	652,60	0,00%
9.1.20	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	38,74	77,48	-	-	-	-	0,00	77,48	0,00%
9.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,81	25,62	-	-	-	-	0,00	25,62	0,00%
9.1.22	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	26,42	343,46	-	-	-	-	0,00	343,46	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
9.1.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	25,00	20,60	515,00	-	-	-	-	0,00	515,00	0,00%
9.1.24	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	21,58	86,32	-	-	-	-	0,00	86,32	0,00%
9.1.25	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	13,00	13,10	170,30	-	-	-	-	0,00	170,30	0,00%
9.1.26	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	23,38	23,38	-	-	-	-	0,00	23,38	0,00%
9.1.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	37,00	13,86	512,82	-	-	-	-	0,00	512,82	0,00%
9.1.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	19,34	38,68	-	-	-	-	0,00	38,68	0,00%
9.1.29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	21,00	31,20	655,20	-	-	-	-	0,00	655,20	0,00%
9.1.30	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	15,00	249,95	3.749,25	-	-	-	-	0,00	3.749,25	0,00%
9.2	LOUÇAS E METAIS				24.863,69				-	0,00	24.863,69	0,00%
9.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	314,46	4.716,90	-	-	-	-	0,00	4.716,90	0,00%
9.2.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	154,03	2.310,45	-	-	-	-	0,00	2.310,45	0,00%
9.2.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	139,88	279,76	-	-	-	-	0,00	279,76	0,00%
9.2.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	326,01	4.890,15	-	-	-	-	0,00	4.890,15	0,00%
9.2.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	338,17	10.145,10	-	-	-	-	0,00	10.145,10	0,00%
9.2.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	36,25	543,75	-	-	-	-	0,00	543,75	0,00%
9.2.7	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	35,63	534,45	-	-	-	-	0,00	534,45	0,00%
9.2.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	13,00	111,01	1.443,13	-	-	-	-	0,00	1.443,13	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,90

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO				27.422,77				-	0,00	27.422,77	0,00%
10.1	TUBOS E CONEXÕES				27.422,77				-	0,00	27.422,77	0,00%
10.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	82,00	22,79	1.868,78	-	-	-	-	0,00	1.868,78	0,00%
10.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	121,00	28,90	3.496,90	-	-	-	-	0,00	3.496,90	0,00%
10.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	174,00	40,26	7.005,24	-	-	-	-	0,00	7.005,24	0,00%
10.1.4	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	254,00	1,63	414,02	-	-	-	-	0,00	414,02	0,00%
10.1.5	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	97,00	2,88	279,36	-	-	-	-	0,00	279,36	0,00%
10.1.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	UN	14,00	437,36	6.123,04	-	-	-	-	0,00	6.123,04	0,00%
10.1.7	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	373,26	373,26	-	-	-	-	0,00	373,26	0,00%
10.1.8	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	16,00	70,32	1.125,12	-	-	-	-	0,00	1.125,12	0,00%
10.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	27,00	11,15	301,05	-	-	-	-	0,00	301,05	0,00%
10.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,00	24,33	218,97	-	-	-	-	0,00	218,97	0,00%
10.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	16,09	643,60	-	-	-	-	0,00	643,60	0,00%
10.1.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	26,66	26,66	-	-	-	-	0,00	26,66	0,00%
10.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	10,00	30,44	304,40	-	-	-	-	0,00	304,40	0,00%
10.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	34,00	10,91	370,94	-	-	-	-	0,00	370,94	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
10.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	15,30	428,40	-	-	-	-	0,00	428,40	0,00%
10.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	28,27	424,05	-	-	-	-	0,00	424,05	0,00%
10.1.17	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	6,00	64,07	384,42	-	-	-	-	0,00	384,42	0,00%
10.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	27,38	328,56	-	-	-	-	0,00	328,56	0,00%
10.1.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	15,92	63,68	-	-	-	-	0,00	63,68	0,00%
10.1.20	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	42,99	601,86	-	-	-	-	0,00	601,86	0,00%
10.1.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	103,00	9,91	1.020,73	-	-	-	-	0,00	1.020,73	0,00%
10.1.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	45,00	18,89	850,05	-	-	-	-	0,00	850,05	0,00%
10.1.23	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	20,15	261,95	-	-	-	-	0,00	261,95	0,00%
10.1.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	24,88	323,44	-	-	-	-	0,00	323,44	0,00%
10.1.25	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	11,80	47,20	-	-	-	-	0,00	47,20	0,00%
10.1.26	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	15,00	8,82	132,30	-	-	-	-	0,00	132,30	0,00%
10.1.27	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	4,79	4,79	-	-	-	-	0,00	4,79	0,00%
11	INSTALAÇÃO REDE PPR - REDE DE GÁS				2.917,59				-	0,00	2.917,59	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
11.1	REDE DE COBRE				879,04				-	0,00	879,04	0,00%
11.1.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	6,00	64,98	389,88	-	-	-	-	0,00	389,88	0,00%
11.1.2	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	7,00	13,63	95,41	-	-	-	-	0,00	95,41	0,00%
11.1.3	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	19,51	19,51	-	-	-	-	0,00	19,51	0,00%
11.1.4	CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2"	UN	4,00	14,16	56,64	-	-	-	-	0,00	56,64	0,00%
11.1.5	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	48,01	96,02	-	-	-	-	0,00	96,02	0,00%
11.1.6	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,83	35,83	-	-	-	-	0,00	35,83	0,00%
11.1.7	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	185,75	185,75	-	-	-	-	0,00	185,75	0,00%
11.2	REDE PEX				951,44				-	0,00	951,44	0,00%
11.2.1	TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	32,00	28,00	896,00	-	-	-	-	0,00	896,00	0,00%
11.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	18,48	55,44	-	-	-	-	0,00	55,44	0,00%
11.3	TESTE DE ESTANQUEIDADE				1.087,11				-	0,00	1.087,11	0,00%
11.3.1	TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE GÁS COM PROFISSIONAL HABILITADO E EMISSÃO DE ART	UND	1,00	1.087,11	1.087,11	-	-	-	-	0,00	1.087,11	0,00%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				61.788,49				-	0,00	61.788,49	0,00%
12.1	TUBOS REDE DE ÁGUA PLUVIAL AMPLIAÇÃO				19.504,69				-	0,00	19.504,69	0,00%
12.1.1	TUBO DE PVC SERIE N AGUA PLUVIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO CONDUTORES VERTICAIS	M	80,00	21,63	1.730,40	-	-	-	-	0,00	1.730,40	0,00%
12.1.2	TUBO PVC SERIE N AGUA PLUVIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO PARA RAMAL DE ENCAMINHAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS	M	101,00	46,53	4.699,53	-	-	-	-	0,00	4.699,53	0,00%
12.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	20,28	93,31	1.892,32	-	-	-	-	0,00	1.892,32	0,00%
12.1.4	TUBO PVC SERIE N AGUA PLUVIAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO PARA RAMAL DE ENCAMINHAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS	M	104,00	102,61	10.671,44	-	-	-	-	0,00	10.671,44	0,00%
12.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	18,25	28,00	511,00	-	-	-	-	0,00	511,00	0,00%
12.2	CAIXAS E CONEXÕES				14.814,40				-	0,00	14.814,40	0,00%
12.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	18,00	448,51	8.073,18	-	-	-	-	0,00	8.073,18	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
12.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	29,15	1.428,35	-	-	-	-	0,00	1.428,35	0,00%
12.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	28,27	735,02	-	-	-	-	0,00	735,02	0,00%
12.2.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	75,00	18,89	1.416,75	-	-	-	-	0,00	1.416,75	0,00%
12.2.5	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	75,00	3,20	240,00	-	-	-	-	0,00	240,00	0,00%
12.2.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,00	71,75	2.511,25	-	-	-	-	0,00	2.511,25	0,00%
12.2.7	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	35,00	11,71	409,85	-	-	-	-	0,00	409,85	0,00%
12.3	CALHAS E RUFO				27.469,40				-	0,00	27.469,40	0,00%
12.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,00	75,35	8.439,20	-	-	-	-	0,00	8.439,20	0,00%
12.3.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00	45,32	9.290,60	-	-	-	-	0,00	9.290,60	0,00%
12.3.3	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	260,00	37,46	9.739,60	-	-	-	-	0,00	9.739,60	0,00%
13	MURO DE FECHAMENTO				115.858,23				-	0,00	115.858,23	0,00%
13.1	ESTRUTURA DE CONCRETO				64.468,69				-	0,00	64.468,69	0,00%
13.1.1	ESCAVAÇÃO DE FORMA				17.372,94				-	0,00	17.372,94	0,00%
13.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,65	221,23	1.913,63	-	-	-	-	0,00	1.913,63	0,00%
13.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,83	102,42	494,68	-	-	-	-	0,00	494,68	0,00%
13.1.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	64,45	161,41	10.402,87	-	-	-	-	0,00	10.402,87	0,00%
13.1.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,01	101,35	4.561,76	-	-	-	-	0,00	4.561,76	0,00%
13.1.2	ARMADURA				19.305,75				-	0,00	19.305,75	0,00%
13.1.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	222,00	15,92	3.534,24	-	-	-	-	0,00	3.534,24	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
13.1.2.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,00	16,76	2.329,64	-	-	-	-	0,00	2.329,64	0,00%
13.1.2.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	301,00	14,04	4.226,04	-	-	-	-	0,00	4.226,04	0,00%
13.1.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,00	12,46	485,94	-	-	-	-	0,00	485,94	0,00%
13.1.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,00	13,99	2.098,50	-	-	-	-	0,00	2.098,50	0,00%
13.1.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,00	10,67	4.097,28	-	-	-	-	0,00	4.097,28	0,00%
13.1.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,00	12,01	2.534,11	-	-	-	-	0,00	2.534,11	0,00%
13.1.3	CONCRETO				27.790,00				-	0,00	27.790,00	0,00%
13.1.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	70,20	147,67	10.366,43	-	-	-	-	0,00	10.366,43	0,00%
13.1.3.2	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	12,25	742,40	9.094,40	-	-	-	-	0,00	9.094,40	0,00%
13.1.3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,87	1.017,55	4.955,46	-	-	-	-	0,00	4.955,46	0,00%
13.1.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,38	998,14	3.373,71	-	-	-	-	0,00	3.373,71	0,00%
13.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				51.389,54				-	0,00	51.389,54	0,00%
13.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	267,64	59,07	15.809,49	-	-	-	-	0,00	15.809,49	0,00%
13.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	535,28	8,50	4.549,88	-	-	-	-	0,00	4.549,88	0,00%
13.2.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	535,28	37,48	20.062,29	-	-	-	-	0,00	20.062,29	0,00%
13.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.070,56	3,99	4.271,53	-	-	-	-	0,00	4.271,53	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
13.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	535,28	12,51	6.696,35	-	-	-	-	0,00	6.696,35	0,00%
14	PSCIP				5.514,70				-	0,00	5.514,70	0,00%
14.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	32,00	24,36	779,52	-	-	-	-	0,00	779,52	0,00%
14.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00	716,78	4.300,68	-	-	-	-	0,00	4.300,68	0,00%
14.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	25,00	17,38	434,50	-	-	-	-	0,00	434,50	0,00%
15	FACHADA EM ACM, COBERTURA E PELE EM VIDRO LAMINADO E BRISE METÁLICO				147.038,07				-	0,00	147.038,07	0,00%
15.1	FACHADA EM ACM INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO	M²	113,60	471,89	53.606,70	-	-	-	-	0,00	53.606,70	0,00%
15.2	COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 8 MM (4 + 4) COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TUBO 50 X 50	M²	45,00	1.399,62	62.982,90	-	-	-	-	0,00	62.982,90	0,00%
15.3	FACHADA EM PELE DE VIDRO COM VIDRO LAMINADO 6 MM 3 + 3 FIXADOS COM PERFIL DE ALUMÍNIO	M²	14,25	951,83	13.563,57	-	-	-	-	0,00	13.563,57	0,00%
15.4	BRISE METÁLICO COM REQUADRO EM PERFIL DUPLO ENRIJECIDO 200 X 100 NA CHAPA #14 E BRISE COM DESENVOLVIMENTO DE 40 CM (10X 20 X 10) COM PINTURA EM FUNDO ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	40,12	420,86	16.884,90	-	-	-	-	0,00	16.884,90	0,00%
16	CASA DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				17.791,73				-	0,00	17.791,73	0,00%
16.1	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,60	218,93	1.444,93	-	-	-	-	0,00	1.444,93	0,00%
16.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	50,30	8,50	427,55	-	-	-	-	0,00	427,55	0,00%
16.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	33,25	157,11	5.223,90	-	-	-	-	0,00	5.223,90	0,00%
16.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	50,30	36,49	1.835,44	-	-	-	-	0,00	1.835,44	0,00%
16.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	31,80	79,06	2.514,10	-	-	-	-	0,00	2.514,10	0,00%
16.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	4,70	65,65	308,55	-	-	-	-	0,00	308,55	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39	Mês 01
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025	Período: 09/03/2026 até 20/05/2026
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha	Data Medição: 20/05/2026
Nº CREA/CAU: SP 5069708256 Visto 30683	Nº CREA/CAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009	Valor da Med.: R\$ 154.560,80

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
16.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,60	61,98	409,06	-	-	-	-	0,00	409,06	0,00%
16.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6,60	62,14	410,12	-	-	-	-	0,00	410,12	0,00%
16.9	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,75	704,30	3.345,42	-	-	-	-	0,00	3.345,42	0,00%
16.10	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	18,50	3,99	73,81	-	-	-	-	0,00	73,81	0,00%
16.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,50	12,51	231,43	-	-	-	-	0,00	231,43	0,00%
16.12	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,00	70,08	280,32	-	-	-	-	0,00	280,32	0,00%
16.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,40	55,41	243,80	-	-	-	-	0,00	243,80	0,00%
16.14	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,20	51,25	471,50	-	-	-	-	0,00	471,50	0,00%
16.15	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	11,80	37,46	442,02	-	-	-	-	0,00	442,02	0,00%
16.16	TUBO DE PVC SERIE N AGUA PLIVIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO CONDUTORES VERTICAIS	M	6,00	21,63	129,78	-	-	-	-	0,00	129,78	0,00%
17	LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)				16.223,87				-	0,00	16.223,87	0,00%
17.1	ELETRODUTOS E ELETROCALHA				6.851,69				-	0,00	6.851,69	0,00%
17.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	11,82	177,30	-	-	-	-	0,00	177,30	0,00%
17.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	31,00	9,70	300,70	-	-	-	-	0,00	300,70	0,00%
17.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	151,00	11,97	1.807,47	-	-	-	-	0,00	1.807,47	0,00%
17.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,00	20,05	741,85	-	-	-	-	0,00	741,85	0,00%
17.1.5	ELETROCALHA PERFURADA, 200 X 100 (CHAPA Nº 18) COM SUPORTE EM PERFILADO FIXADOS A CADA 1,50 METROS INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	M	4,00	68,81	275,24	-	-	-	-	0,00	275,24	0,00%
17.1.6	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	188,00	15,04	2.827,52	-	-	-	-	0,00	2.827,52	0,00%

Município: Prefeitura Municipal de Figueirao	Valor da obra: R\$ 2.081.654,39
Obra: Obra de construção do Lar da Pessoa Idosa	Nº do Contrato: Nº 019/2025
Responsável Técnico Fiscal: Eng. Civil Lucas Parreira Barbosa	Responsável Técnico Executor: Tiago Cortez Bacha
Nº CREACAU: SP 5069708256 Visão 30683	Nº CREACAU: 5069708728 SP - MS VISTO 32009

Mês 01

Período: 09/03/2026 até 20/05/2026

Data Medição: 20/05/2026

Valor da Med.: R\$ 154.560,80

Rua: Lúcia Ceciliano Vilares, nº 220
Vila: Glória - Campo Grande/MS
CEP: 79.004-260

BOLETIM DE MEDICAÇÃO

Item	Descrição	Und.	Quant. Total	Unit. c/ BDI	Total Contratado	Período Anterior (Quant.)	Período Atual (Quant.)	Período Acumul. (Quant.)	Valor Mês (R\$)	Total Medido (R\$)	Saldo a Medir (R\$)	% Exec.
17.1.7	CONDUTELE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	8,00	35,20	281,60	-	-	-	-	0,00	281,60	0,00%
17.1.8	CONDUTELE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	8,00	27,74	221,92	-	-	-	-	0,00	221,92	0,00%
17.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	11,00	13,75	151,25	-	-	-	-	0,00	151,25	0,00%
17.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4,00	16,71	66,84	-	-	-	-	0,00	66,84	0,00%
17.2	CABOS				5.500,88				-	0,00	5.500,88	0,00%
17.2.1	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2025	M	532,00	10,34	5.500,88	-	-	-	-	0,00	5.500,88	0,00%
17.3	TOMADAS				1.243,44				-	0,00	1.243,44	0,00%
17.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2025	UN	24,00	51,81	1.243,44	-	-	-	-	0,00	1.243,44	0,00%
17.4	RACK				2.627,86				-	0,00	2.627,86	0,00%
17.4.1	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2025	UN	1,00	2.627,86	2.627,86	-	-	-	-	0,00	2.627,86	0,00%
18	PROJETO DE LICENÇA AMBIENTAL				21.885,46				-	0,00	21.885,46	0,00%
18.1	Elaboração do Projeto Ambiental para obtenção do licenciamento ambiental da Casa de Repouso, incluindo levantamento in loco e a condução das etapas da Licença Prévia à Licença de Operação, conforme Resolução SEMADE nº 09/2015.	UD	1,00	21.885,46	21.885,46	-	-	-	-	0,00	21.885,46	0,00%
19	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				92.479,20				6.515,58	6.515,58	85.963,62	7,04%
19.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	142,52	62.708,80	-	31,00	31,00	4.418,12	4.418,12	58.290,68	7,04%
19.2	ENCAREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	33,83	29.770,40	-	62,00	62,00	2.097,46	2.097,46	27.672,94	7,04%
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$):					R\$ 2.081.654,39	PERCENTUAL DO PERÍODO (R\$):			R\$ 154.560,80	R\$ 154.560,80	R\$ 1.927.093,59	7,42%
PERCENTUAL TOTAL DO CONTRATO (%):					100,00%	PERCENTUAL PERÍODO (%):			7,42%	7,42%	92,58%	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS:					R\$ 154.560,80							
VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:					R\$ 0,00							
EXECUTADO NO PERÍODO:					R\$ 154.560,80							
PERCENTUAL EXECUTADO:					7,42%							
SALDO DA OBRA:					1.927.093,59							
VALOR DO ORÇAMENTO ATUALIZADO:					2.081.654,39							

Documento assinado digitalmente
TACIO CORTEZ BACHIA
Data: 22/05/2026 15:35:17 -0500
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico / Eng. Civil Tiago Cortez Bacha
CREA Nº: 5069708728 SP - MS VISTO 32009

Fiscal do Contábil / Eng. Civil Lucas Parreira Barboosa
CRECAU N.º SP 5069708256 Visto 30683

Documento assinado digitalmente

Lucas PARRERA BARBOOSA
Data: 22/05/2026 15:43:58 -0300
Verifique em <https://valida.it.gov.br>

gov.br



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.028.70767/73	Nome da obra CONSTRUÇÃO LAR DA PESSOA IDOSA - E X L ENGENHARIA LTDA			
Data do cadastramento 22/05/2026 14:20	Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Urbana	ART 1320260032749	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 062018
Data do início da obra 10/03/2026	CNAE 4120400 Construção de edifícios			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 10/03/2026
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município FIGUEIRAO	UF MS	CEP 79.428-959	
Bairro FIGUEIRAO VELHO	Logradouro AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO 592 CLIQUE E RETIRE CORREIOS			Número 350

Responsável

Nome E X L ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 33.188.055/0001-26	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 10/03/2026	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.158.578/0001-10	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	786,60 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
786,60 m²

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 135 Tipo.: Global Data.: 11/2/2026
Contrato: 19/2026
Nr. Licitação: 6/2025
Modalidade: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia N.º Ata.:
Obra: 1/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3427 - E X L ENGENHARIA LTDA C.N.P.J./C.P.F.: 33.188.055/0001-26
Endereço.: Rua Luís Ceciliano Vilares, Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: OBRAS

VALOR

2.081.654,39 (Dois Milhões, Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Lar da Pessoa Idosa, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Figueirão/MS, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 842
Órg. Unid.: 07.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.: 15 Urbanismo
Sub-Função.: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa.: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.: 1080 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
El. Despesa.: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SubElemento.: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recursos.: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

2500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

2.081.654,39

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.743.001,70 Lanç. Empenho.: 2.081.654,39 Saldo Atual.: 661.347,31

Data da consulta: 27/05/2026 16:07:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 33.188.055/0001-26

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: E X L ENGENHARIA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO** optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: **NÃO** enquadrado no SIMEI

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E X L ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.188.055/0001-26

Certidão nº: 44533585/2026

Expedição: 28/04/2026, às 13:52:20

Validade: 25/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E X L ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.188.055/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.188.055/0001-26
Razão Social: E X L ENGENHARIA LTDA
Endereço: R LUIS CECILIANO VILARES 220 SALA 06 / VILA GLORIA / CAMPO GRANDE / MS / 79004-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051318365326102132

Informação obtida em 22/05/2026 14:24:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E X L ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.188.055/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:02:28 do dia 17/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2026.

Código de controle da certidão: **3DD2.F6CC.00E2.C098**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº672742/26-90

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: E X L ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 33.188.055/0001-26

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até: 28 de maio de 2026

Campo Grande, 28 de abril de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>

Código de Autenticidade: **4F086CDC835FE1593973C68614030DFD**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **483330/2026**

Contribuinte: E X L ENGENHARIA LTDA
CCE: **28.486.672-5**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:55:34 horas do dia 12/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.028.70767/73	Nome da obra CONSTRUÇÃO LAR DA PESSOA IDOSA - E X L ENGENHARIA LTDA			
Data do cadastramento 22/05/2026 14:20	Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Urbana	ART 1320260032749	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 062018
Data do início da obra 10/03/2026	CNAE 4120400 Construção de edifícios			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 10/03/2026
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município FIGUEIRAO	UF MS	CEP 79.428-959
Bairro FIGUEIRAO VELHO	Logradouro AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO 592 CLIQUE E RETIRE CORREIOS	Número 350	

Responsável

Nome E X L ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 33.188.055/0001-26	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 10/03/2026	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.158.578/0001-10	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	786,60 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 786,60 m²
