

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Restos a Pagar

Data.....: 15/06/2026

Nº do Empenho: 2380/2025

Data do empenho.....: 23/12/2025

Contrato: 159/2025

Licitacao.: 7/2025

Processo.

Modalidade: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia

Obra: 9/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3413 - PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 43.862.930/0001-67

Endereço: Outros Pedro Candido Lemos,193

Cidade: Paraíso das Águas

UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 385.000,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4: 39.678,31

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 379.052,03

Saldo a pagar do Empenho: 5.947,97

Líquido a Pagar: 39.678,31

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo nos lotes destinados à habitação de interesse social localizados nas Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 822

Órg. Unid.....: 09.003

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

Função.....: 15

Urbanismo

Sub-Função.....: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa.....: 0004

PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Proj./Ativ.....: 1080

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

El. Despesa.....: 4.4.90.51

Obras e Instalações

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

2500.7000 Sem Código de Acompanhamento

39.678,31

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 82295- C/C. 10.109- 5-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109-5

DEBITO EM CONTA 0

39.678,31

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 8229-5
Conta corrente 10109-5 PM FIGUEIRAO FPM

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4256 CREDIJUD
Conta corrente (com DV) 701220
CNPJ 43.862.930/0001-67
Nome favorecido PIRAMIDE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.502
Valor 39.678,31
Destinação 0
Data transferência 15/06/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 959AA93039C0FDC3

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

15/06/2026 14:52:44


15/06/2026 15:05:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 17/07/2026
Conta Extra-Orçamentária: 1 - INSS	
CREDOR	
3413 - PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	980,39
Líquido a Pagar	980,39
Novecentos e Oitenta Reais e Trinta e Nove Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
1 - Ag. 82295- C/C. 10.109- 5-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109 DEBITO EM CONTA 0	980,39
Recebi a importância acima processada	
Credor	



Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 439

Data...: 11/06/2026

Ref OP nº 2103 - Emp. nº 2380 - PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 43862930000167

Numero da Nota Fiscal : 225

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1 21881010200 INSS

VALOR

980,39 Novecentos e Oitenta Reais e Trinta e Nove Centavos.

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo nos lotes destinados à habitação de interesse social localizados nas Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 82295

C/C: 10.109- 5


VALOR:

980,39

FIGUEIRÃO, 11 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: ____ / ____ / ____ .


THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.158.578/0001-10	Razão Social MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	Pagar este documento até 20/07/2026
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26187.3887267-0
Observações		Valor Total do Documento 980,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	980,39			980,39
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:43.862.930/0001-67				
	Totais	980,39			980,39

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/07/2026 16:44:40

85860000009 8 80390385262 0 01071626187 9 38872670033 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 80390385262 0 01071626187 9 38872670033 1



CNPJ: 07.158.578/0001-10
Número: 07.16.26187.3887267-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 980,39

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.21
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO FPM
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.109-5
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000009-8 80390385262-0
01071626187-9 38872670033-1

Data do pagamento 17/07/2026
Numero do Documento 07.16.26187.3887267-0
Valor Total 980,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

17/07/2026 11:08:07

17/07/2026 11:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Restos a Pagar

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 4	Tipo: Liquidação de Restos a Pagar				
Nº do Empenho: 2380	Data do empenho: 23/12/2025				
Data: 11/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 3413 - PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 43.862.930/0001-67				
Endereço: Outros Pedro Candido Lemos, 193	Cidade: Paraíso das Águas UF: MS				
Telefone:	FAX:				
Banco:	Agência: Conta:				
VALORES					
Valor do Empenho:	385.000,00				
Valor da Nota de Liquidação:	42.441,23				
Valor a Liquidar:	5.947,97				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
673 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1 10.109- 5 509,29				
684 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1 10.109- 5 1.273,24				
1 INSS	1 10.109- 5 980,39				
Total das Retenções:	2.762,92				
Valor Líquido Liquidado:	39.678,31				
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo nos lotes destinados à habitação de interesse social localizados nas Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 822					
Órg. Unid.: 09.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE				
Função: 15	Urbanismo				
Sub-Função: 451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA				
Proj./Ativ.: 1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
El. Despesa: 4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
F. de Recursos: 2500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
2500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	42.441,23				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
225/0	11/06/2026		42.441,23	0,00	42.441,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 509,29 (Quinhentos e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo nos lotes destinados à habitação de interesse social localizados nas Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme condições e exigências previstas neste instrumento e seus anexos.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2103 - Emp. nº 2380 - PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 43862930000167 Numero da Nota Fiscal : 225 Assinatura _____ THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Lançamento Nº:	2131	
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução	NÃO	
Vencimento	11/06/2026	
Conta	1-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109-5	
Autenticação		

OSTA POR 2 PÁGINA(S)



MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

225

Código de Verificação de Autenticidade

JVZM7PU21

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/06/2026 às 16:45:03

Chave de Acesso

YOP3UM3980DGF7T1Y7BYR57ETMXIM50I

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.81.37.97:8090/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FIGUEIRAO-MS	Local da Prestação FIGUEIRAO - MS
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 10/06/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.862.930/0001-67	RG/Inscrição Estadual 874	Inscrição Municipal 000024293	Nome/Razão Social PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Logradouro JORCELINO PEREIRA DE REZENDE, 58	Complemento	Bairro LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO	
CEP 79556024	Cidade PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS	Telefone 67996070878	E-mail piramideparaíso@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.158.578/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO
Logradouro Avenida Moises de AraA°jo GalvA°o, 591	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 79428-000	Cidade/País FIGUEIRAO - MS	Cod. IBGE 67 3274 1357	E-mail figueirao@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	4ª MEDIÇÃO - Execução de construção de muro de arrimo nos lotes, destinados à habitação de interesse social localizados nas Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.	42.441,23	R\$ 42.441,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070201	Alíquota 5,00%	Atividade Município 000007.0200001	Código CNAE
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...			
Deduções Base Cálculo R\$ 16.976,49	Base de Cálculo R\$ 25.464,74	Total do ISS R\$ 1.273,24	Retenção do ISS 1 - Sim

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Contribuições Sociais Retidas R\$ 0,00
PIS - Retido R\$ 0,00	COFINS - Retido R\$ 0,00	Descrição - Contribuições Sociais Retidas	
CP(8.912,66 x 11,00%) R\$ 980,39	IRRF(42.441,23 x 1,20%) R\$ 509,29	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor total da NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 42.441,23	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 1.273,24	Tributos federais retidos R\$ 1.489,68
---	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 39.678,31

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ORDEM DO SERVIÇO N 1229/2026 - CODIGO 27257; Nº EMPENHO 2380, COTRATO 159/2025, CNO 90.027.41078/70

RECEBI(EMOS) DE **PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **225** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JVZM7PU21**.

Data

CPF/RG

Assinatura

$$INSS \ 42.441,23 \cdot 60\% = 25.464,74 \cdot 35\% = 8.912,66$$

980,39

(756) 4256 70.122-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
os serviços constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 11 de 06 de 26
Lucas Barbosa 034360011-04
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor 43.862.930/0001-67	Número da Nota 225	Código de Verificação JVZM7PU21
---	------------------------------	---

Destinatário		
CPF/CNPJ/NIF -	Nome/Razão Social -	
Logradouro -	Complemento -	Bairro -
CEP/Cod.Postal -	Cidade/País -	Telefone -
		E-mail -

Adquirente		
CPF/CNPJ/NIF 07.158.578/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
Logradouro Avenida Moises de AraÃºjo GalvÃ£o	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE FIGUEIRÃº	
CEP/Cod.Postal 79428-000	Cidade/País FIGUEIRAO - MS	
	Complemento Predio Publico	Bairro Centro
	IBGE 5003900	Telefone (67) 3274-1357
		E-mail figueirao@uol.com.br

Informações Sobre o Serviço Prestado	
Local de Incidência do IBS 5003900 - FIGUEIRAO-MS	Código Indicador da Operação null
Tipo de Operação	Operação de Uso Não
Classificação Tributária null	Situação Tributária null
Nomenclatura Brasileira de Serviços 101056000 - Serviços de alvenaria	

Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Alíquota da CBS (%)
R\$ 0,00	R\$ 41.167,99	0,10	0,00	0,90
Redução de Alíquota do IBS (%)	Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	
0,00	0,00	0,00	0,90	
Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,17	R\$ 370,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS**

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
os serviços constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 11 de 06 de 26

Lucas R. Barbosa 034360011-04
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirópolis/MS

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE SERVIÇO Nº 1229/2026 - CÓDIGO 27257

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Sector: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . . / -
Solicitante..: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 43862930000167
Razão Social: 3424 - PIRAMIDE CONSTRUÇOES E SERVICOSLTDA
Nome Fantasia: PIRAMIDE CONSTRUÇOES E SERVICOSLTDA
Insc.Est.: 284668346
Cidade: Paraíso das Águas / MS
Tel. Fixo: (67) 99607-0878

LICITAÇÃO

Modalidade: Conc. Eletrônica
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2182
Data Homologação: 23/12/2025
Nr. Licitação: 07/2025
Nr. Contrato: 159/2025 - Dt. Venc: 23/08/2026
Nr. Processo da Licitação: 17643/2025
Nr. Processo do Protocolo: 5824/2025
Cód. Protocolo(s): 0
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4781

Utilização: Contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo nos lotes destinados à habitação de interesse social localizados nas Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 842 - **Dotação:** 07.001-15.451.0004.1080-4.4.90.51.00.2.500.0007000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
19874		Execução de construção de muro de arrimo nos lotes destinados à habitação de interesse social localizados nas 1 Quadras 05 e 06 do Loteamento Residencial Figueira, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SV	42441,23	0,00	42.441,23

Valor Total: 42.441,23
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifas: 0,00
Valor Liquido: 42.441,23

quarta-feira, 10 de junho de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Serviço, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO



Piramide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS

EMPRESA CONTRATADA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NOS LOTES DESTINADOS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL LOCALIZADOS NAS QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOCAL: QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA

CIDADE: FIGUEIRÃO - MS

DATA BASE: SINAP 09/2025 - AGESUL 06/2025 - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATO	159/2025
DATA BASE	set/25
DESCONTO	13,0762609%
BDI COMPOSIÇÃO	26,24%
MEDIÇÃO:	04ª MEDIÇÃO
PERÍODO	06/ 05 / 2026 A 10 / 06 / 2026
DATA	10/06/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	ORÇADO CONTRATUAL			QDE ATUALIZADA	VALOR ATUALIZADO	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR EXECUTADO		
				CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)			ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,40	501,75	1.204,20	2,40	1.204,20	2,40		2,40	1.204,20	-	1.204,20
0101001146	1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	4,00	719,27	2.877,08	4,00	2.877,08	4,00		4,00	2.877,08	-	2.877,08
0101003100	1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO	UN	1,00	3.680,61	3.680,61	1,00	3.680,61	1,00		1,00	3.680,61	-	3.680,61
100962	1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	708,30	3,16	2.238,23	708,30	2.238,23	470,00	210,00	680,00	1.485,20	663,60	2.148,80
		TOTAL 1				10.000,12		10.000,12				9.247,09	663,60	9.910,69
	2	ESTRUTURA												
	2.1	ESTACAS												
98525	2.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	612,00	157,75	96.543,00	612,00	96.543,00	612,00		612,00	96.543,00	-	96.543,00
		SUBTOTAL 2.1				96.543,00		96.543,00				96.543,00	-	96.543,00
	2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO												
96522	2.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	59,98	155,89	9.349,66	59,98	9.349,66	59,98	0,00	59,98	9.349,66	-	9.349,66
101616	2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	99,96	6,92	691,72	99,96	691,72	99,96	0,00	99,96	691,72	-	691,72
96619	2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	5,00	42,84	214,11	5,00	214,11	5,00	0,00	5,00	214,11	-	214,11
96545	2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	425,46	17,32	7.368,97	425,46	7.368,97	425,46	0,00	425,46	7.368,97	-	7.368,97
96546	2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1038,41	15,14	15.721,53	1038,41	15.721,53	1.038,41	0,00	1.038,41	15.721,53	-	15.721,53
94965	2.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	59,98	566,08	33.951,21	59,98	33.951,21	59,98	0,00	59,98	33.951,21	-	33.951,21
103670	2.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	59,98	323,53	19.404,04	59,98	19.404,04	59,98	0,00	59,98	19.404,04	-	19.404,04
98557	2.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	407,40	44,33	18.060,04	407,40	18.060,04	407,40	0,00	407,40	18.060,04	-	18.060,04
		SUBTOTAL 2.2				104.761,28		104.761,28				104.761,28	-	104.761,28
	2.3	VIGAS BALDRAMES												
96527	2.3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	12,02	113,63	1.365,83	12,02	1.365,83	8,00	4,02	12,02	909,04	456,79	1.365,83
101616	2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	36,06	6,92	249,54	36,06	249,54	24,00	12,06	36,06	166,08	83,46	249,54
96536	2.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	24,04	68,27	1.641,21	24,04	1.641,21	15,90	8,14	24,04	1.085,49	555,72	1.641,21



Piramide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS

EMPRESA CONTRATADA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NOS LOTES DESTINADOS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL LOCALIZADOS NAS QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOCAL: QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA

CIDADE: FIGUEIRÃO - MS

DATA BASE: SINAP 09/2025 - AGESUL 06/2025 - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATO	159/2025
DATA BASE	set/25
DESCONTO	13,0762609%
BDI COMPOSIÇÃO	26,24%
MEDICÃO:	04ª MEDICÃO
PERÍODO	06/05/2025 A 10/06/2026
DATA	10/06/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	ORÇADO CONTRATUAL			QDE ATUALIZADA	VALOR ATUALIZADO	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR EXECUTADO		
				CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)			ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
92759	2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197,27	15,19	2.996,53	197,27	2.996,53	197,27	0,00	197,27	2.996,53	-	2.996,53
92762	2.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	861,87	11,97	10.316,58	861,87	10.316,58	861,87	0,00	861,87	10.316,58	-	10.316,58
94965	2.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,21	566,08	4.082,57	7,21	4.082,57	4,76	2,45	7,21	2.694,54	1.388,03	4.082,57
103670	2.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,21	323,53	2.333,30	7,21	2.333,30	4,76	2,45	7,21	1.540,00	793,30	2.333,30
98557	2.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	132,22	44,33	5.861,31	132,22	5.861,31	0,00	132,22	132,22	-	5.861,31	5.861,31
93382	2.3.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4,81	28,58	137,41	4,81	137,41	3,17	1,64	4,81	90,60	46,81	137,41
				SUBTOTAL		28.984,28		28.984,28				19.798,86	9.185,42	28.984,28
2.4 PILARES														
92269	2.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	16,80	126,69	2.128,39	16,80	2.128,39	11,28	5,52	16,80	1.429,06	699,33	2.128,39
92759	2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,88	15,19	2.094,40	137,88	2.094,40	137,88	0,00	137,88	2.094,40	-	2.094,40
92762	2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1744,53	11,97	20.882,02	1744,53	20.882,02	1744,53	0,00	1.744,53	20.882,02	-	20.882,02
94965	2.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,90	566,08	2.771,53	4,90	2.771,53	3,25	1,65	4,90	1.839,76	931,77	2.771,53
103670	2.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,90	323,53	1.584,00	4,90	1.584,00	3,25	1,65	4,90	1.051,47	532,53	1.584,00
				SUBTOTAL		29.460,34		29.460,34				27.296,71	2.163,63	29.460,34
2.5 VIGA RESPALDO														
96542	2.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	33,84	100,13	3.388,20	33,84	3.388,20	22,33	11,51	33,84	2.235,90	1.152,30	3.388,20
92759	2.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,30	15,19	3.194,46	210,30	3.194,46	210,30	0,00	210,30	3.194,46	-	3.194,46
92762	2.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	631,82	11,97	7.562,89	631,82	7.562,89	631,82	0,00	631,82	7.562,89	-	7.562,89
94965	2.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,15	566,08	5.746,84	10,15	5.746,84	6,70	3,45	10,15	3.792,74	1.954,10	5.746,84
103670	2.5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	10,15	323,53	3.284,48	10,15	3.284,48	6,70	3,45	10,15	2.167,65	1.116,83	3.284,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS

EMPRESA CONTRATADA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NOS LOTES DESTINADOS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL LOCALIZADOS NAS QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOCAL: QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA

CIDADE: FIGUEIRÃO - MS

DATA BASE: SINAP 09/2025 - AGESUL 06/2025 - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATO	159/2025
DATA BASE	set/25
DESCONTO	13,0762609%
BDI COMPOSIÇÃO	26,24%
MEDICÃO:	04ª MEDICÃO
PERÍODO	06/ 05 / 2025 A 10 / 06 / 2026
DATA	10/06/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	ORÇADO CONTRATUAL			QDE ATUALIZADA	VALOR ATUALIZADO	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR EXECUTADO		
				CONTRATUAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)			ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
				SUBTOTAL		23.176,87		23.176,87				18.953,64	4.223,23	23.176,87
				TOTAL 2		282.925,77		282.925,77				267.353,49	15.572,28	282.925,77
	3	ALVENARIA												
89462	3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	203,03	126,39	25.660,71	203,03	25.660,71	135,00	68,03	203,03	17.062,65	8.598,06	25.660,71
98555	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	406,06	33,67	13.671,91	406,06	13.671,91	270,00	136,06	406,06	9.090,90	4.581,01	13.671,91
87905	3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	406,06	8,73	3.544,87	406,06	3.544,87	270,00	136,06	406,06	2.357,10	1.187,77	3.544,87
104237	3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	406,06	57,34	23.283,25	406,06	23.283,25	270,00	136,06	406,06	15.481,80	7.801,45	23.283,25
90282	3.5	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	3,13	570,77	1.785,46	3,13	1.785,46	2,10	1,03	3,13	1.198,62	586,84	1.785,46
92919	3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,03	13,02	1.731,99	133,03	1.731,99	88,23	44,80	133,03	1.148,75	583,24	1.731,99
				TOTAL 3		69.678,19		69.678,19				46.339,82	23.338,37	69.678,19
	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA												
94295	4.1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	7372,89	14.745,78	2,00	14.745,78	1,40	0,30	1,70	10.322,05	2.211,87	12.533,92
90778	4.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	145,58	4.658,56	32,00	4.658,56	23,00	4,50	27,50	3.348,34	655,11	4.003,45
				TOTAL 4		19.404,34		19.404,34				13.670,39	2.866,98	16.537,37
	5	LIMPEZA FINAL												
2201000010	5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	758,36	3,94	2.991,58	758,36	2.991,58	0,00		-	-	-	-
				TOTAL 5		2.991,58		2.991,58				-	-	-
		TOTAL GERAL				385.000,00		385.000,00				336.610,80	42.441,23	379.052,03

PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:43862930000167

Assinado de forma digital por
PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA:43862930000167
Dados: 2026.06.10 14:56:55 -04'00'

LINDOMAR DA SILVA PINHEIRO
Sócio-Administrador
CPF:005.774.461-00
PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUCAS PARREIRA BARBOSA
Data: 10/06/2026 16:24:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Parreira Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069708256



Pirâmide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


RELATORIO FOTOGRAFICO - 4ª MEDIÇÃO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/ MS			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NOS LOTES DESTINADOS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
LOCALIZADOS NAS QUADRAS 05 E 06 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
ENDEREÇO: QUADRAS 05 E 06, RESIDENCIAL FIGUEIRA, FIGUEIRÃO -MS			
EMPRESA: PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N° 43.862.930/0001-67			
Medição n°	3ª (Terceira)	Contrato n°	159/2025
Período da Medição:	06/05/2026 A 10/06/2026	Processo n°	17643/2025
Data da Medição	10/06/2026	Data O.I.S.	28/012026





Piramide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

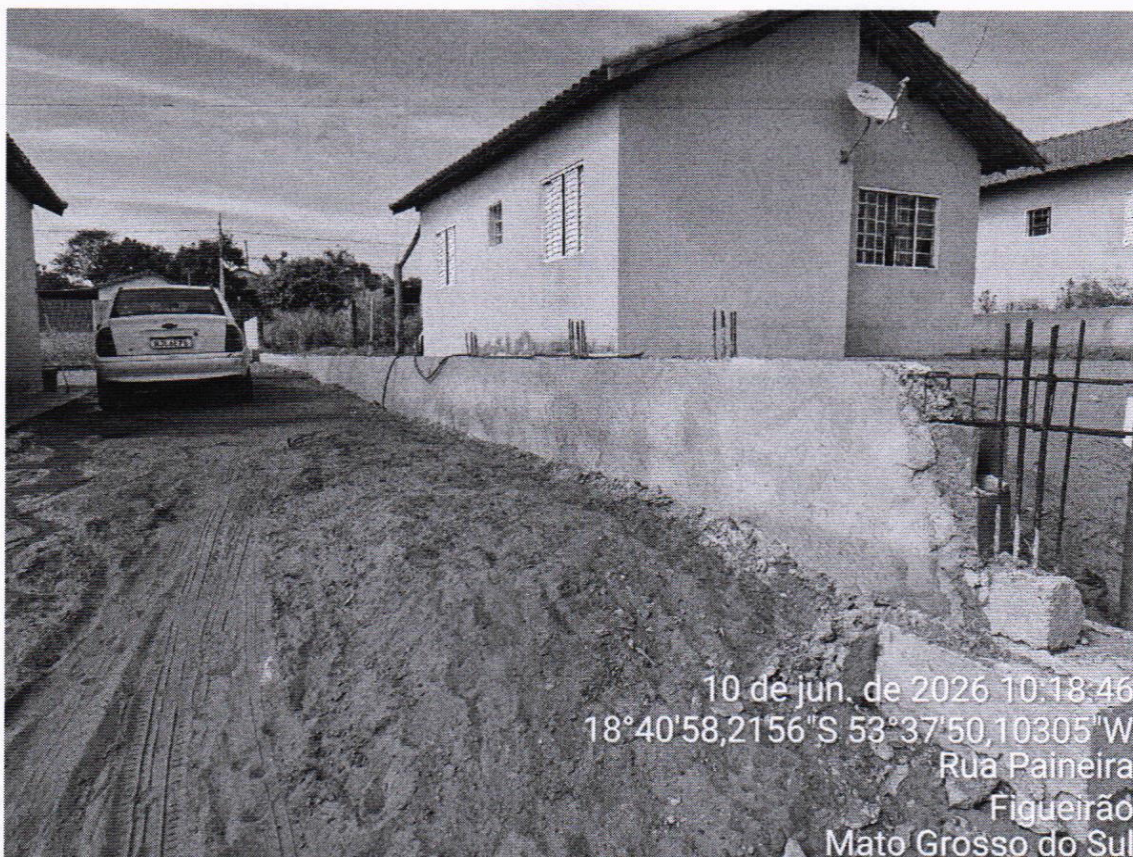

10 de jun. de 2026 10:18:46
18°40'58,2156"S 53°37'50,10305"W
Rua Paineira
Figueirão
Mato Grosso do Sul



10 de jun. de 2026 10:19:00
18°40'58,53048"S 53°37'50,39575"W
Rua Paineira
Figueirão
Mato Grosso do Sul

Página 2 de 6



Piramide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



10 de jun. de 2026 10:19:11
18°40'58,78606"S 53°37'50,67124"W
Rua Jatobá
Figueirão
Mato Grosso do Sul



10 de jun. de 2026 10:19:25
18°40'59,13383"S 53°37'50,93618"W
Rua Jatobá
Figueirão
Mato Grosso do Sul



Piramide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



10 de jun. de 2026 10:19:47
18°40'58,39017"S 53°37'50,51886"W
Rua Jatobá
Figueirão
Mato Grosso do Sul



10 de jun. de 2026 10:20:01
18°40'58,06232"S 53°37'50,29194"W
Rua Jatobá
Figueirão
Mato Grosso do Sul



Piramide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



10 de jun. de 2026 10:21:14
18°40'57.4303"S 53°37'51.83207"W
Rua Paineira
Figueirão
Mato Grosso do Sul



10 de jun. de 2026 10:21:28
18°40'57.0676"S 53°37'51.55778"W
Rua Paineira
Figueirão
Mato Grosso do Sul



Pirâmide
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



10 de jun. de 2026 10:21:46
18°40'56,50152"S 53°37'51,41083"W
Rua Paineira
Figueirão
Mato Grosso do Sul



Documento assinado digitalmente
LUCAS PARREIRA BARBOSA
Data: 10/06/2026 16:25:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Técnico Fiscalização: Lucas Parreira Barbosa
CREA VISTO MS 30683



Documento assinado digitalmente
JOYLER KEITH COSTA LEMES
Data: 10/06/2026 15:42:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Resp. Técnica Execução: Joyler Keith Costa Lemes
CREA/MS 5276

Página 1 de 1

**MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS**

CNPJ: 17361639000103

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - Telefone:

Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 481 - CENTRO

Certidão negativa do contribuinte**CERTIDÃO NEGATIVA DO CONTRIBUINTE Nº 3820/2026**

Contribuinte PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ 43862930000167	RG/Inscr. Estadual	Cadastro 000024293
Endereço JORCELINO PEREIRA DE REZENDE, nº 58 - LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO	CEP 79556024	Cidade PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS	
Endereço de Correspondência			
Endereço Correspondência JORCELINO PEREIRA DE REZENDE, nº 58 - LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO		Cidade PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS	CEP 79556024

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal em cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pelo Município de Paraíso das Águas

MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS, 10 de junho de 2026

Documento valido até: 09/08/2026

Código para consulta da autenticidade: 394B33E8ABEF7A71

Acesse <https://paraisodasaguas.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **473433/2026**

Contribuinte: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CCE: **28.466.834-6**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 13:37:50 horas do dia 08/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Data da consulta: 11/06/2026 16:54:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.862.930/0001-67

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PIRAMIDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual


Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.862.930/0001-67

Certidão nº: 51296674/2026

Expedição: 29/05/2026, às 16:23:21

Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIRAMIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.862.930/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.862.930/0001-67

Razão social: PIRAMIDE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JORCELINO PEREIRA DE REZENDE 58 / LOTEAMENTO PATRIMOM /
PARAISO DAS AGUAS / MS / 79556-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060805285726047176

Informação obtida em 10/06/2026 08:36:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PIRAMIDE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 43.862.930/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:42 do dia 22/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2026.

Código de controle da certidão: **44F7.3082.DE10.4DCC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
